

AIDD 導入計画

GitHub Copilot を「配る」から「組織で検証して使う」へ
開発本部 AI 推進チーム 2026-10-07

90 日のパイロットで「検証できる AI 開発」の仕組みを作り、全社展開を実測で判断する

Copilot を配るだけでは成果は増えない。AI に渡す前提知識と、出力を検証する仕組みに投資する

暗黙知はインタビュー skill で引き出し、評価で効果が確認できた分だけ基盤に入れる

PR サイズ・レビュー・権限・費用のガードレールを、生成の強化と同時に敷く


Day90 に、速度・安定性・費用の実測で全社展開を判断する

目次

1. 現状と課題
2. 業界動向と仮説の修正
3. 打ち手
4. 実行計画と判断事項


01 現状と課題

ライセンスは全員に行き渡ったが、PR に効いている使い方は 1 割にとどまる

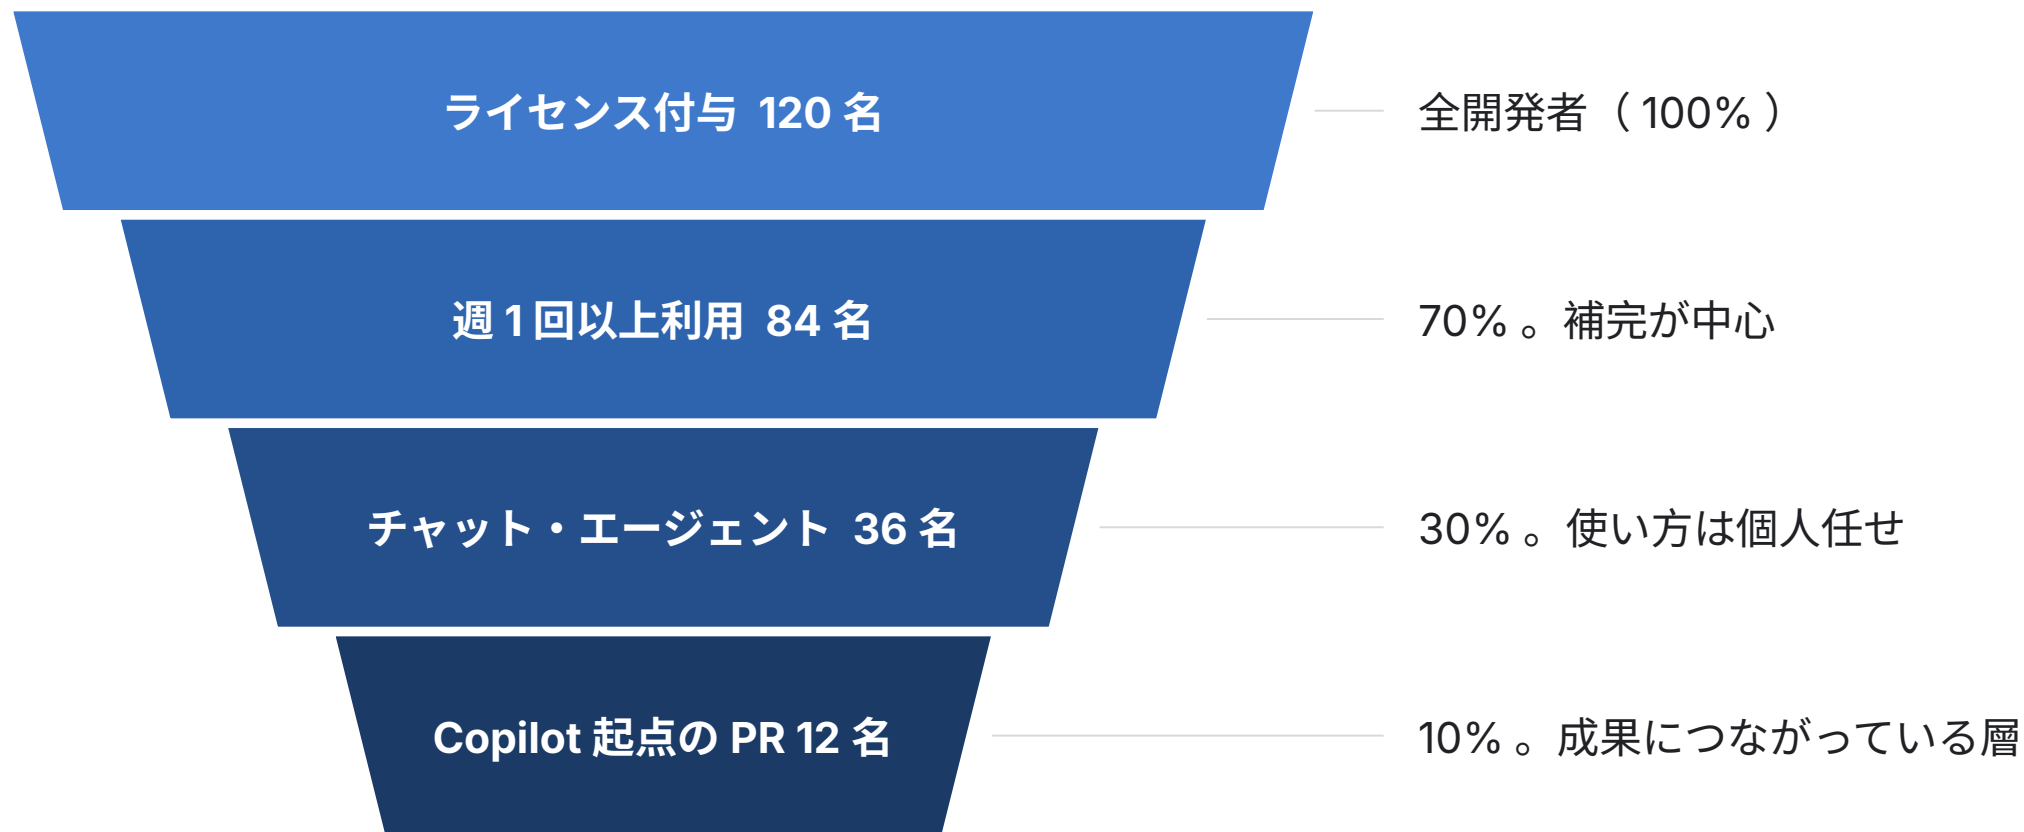

数値はすべて想定値。課題は利用率ではなく、PR まで届く使い方の仕組みが無いこと

成果が出ない原因を 3 系統 6 要因に分解し、それぞれにアクションを割り当てる

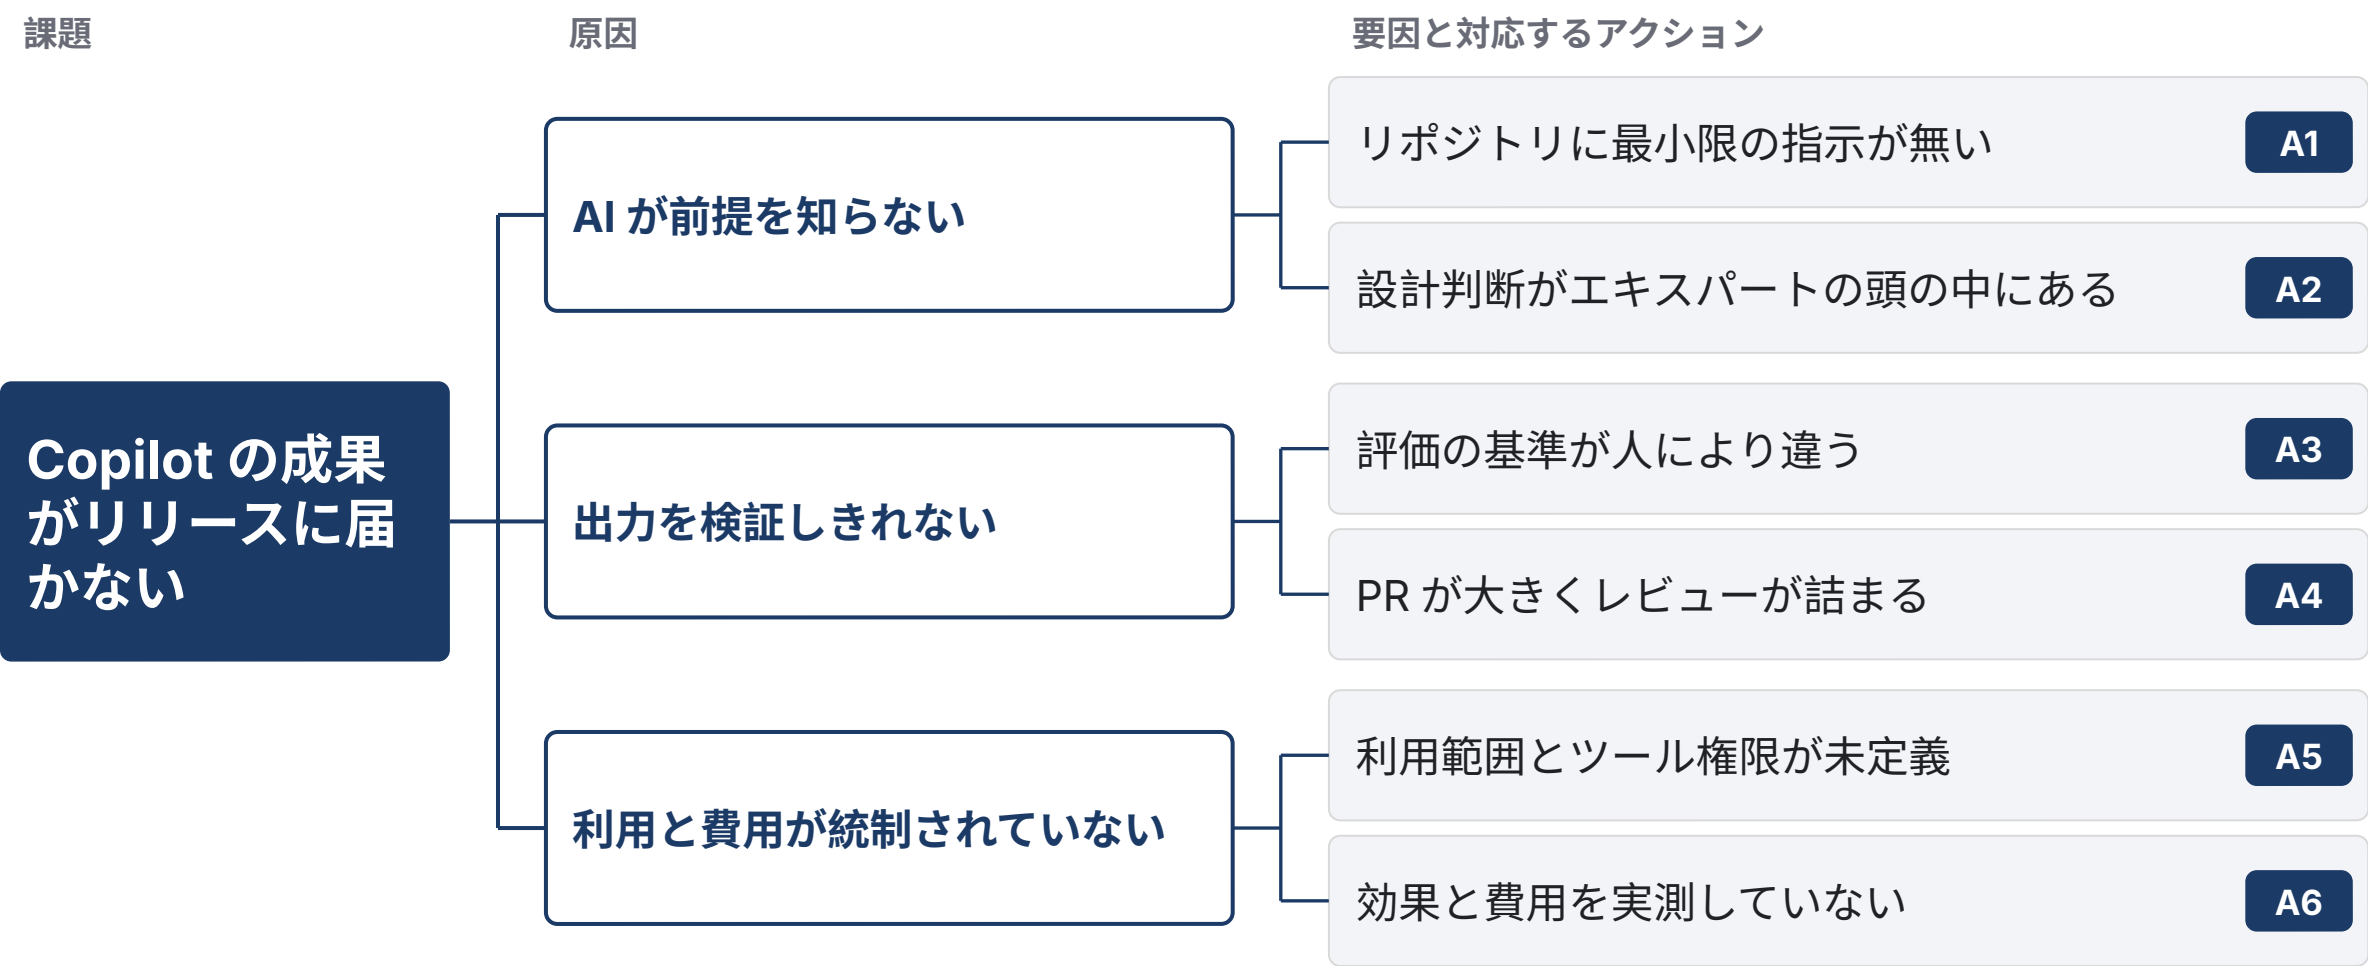

02 業界動向と仮説の修正

業界データは「使えば速くなる」を支持しない。AIは増幅器で、詰まる場所が生成から検証へ移る

+98 %

マージ PR 数

AI 高利用者
Faros AI 2025

+91 %

PR のレビュー時間

会社単位では差が出ない

-19 %

熟練者の作業速度

METR 2025
本人の体感は +20%

+20 % 超

推論コスト

LLM 生成の AGENTS.md
成功率も低下

DORA 2025 の結論も同じ。AI は強いチームを強くし、弱い仕組みの綻びを広げる

当初の仮説は方向は正しいが、「多いほど良い」「入口だけ」「人は育つ」の3点を修正する

当初の仮説	支持する根拠	盲点（反証）	修正後の方針
コンテキスト基盤を作る	DORA: 社内データへの AI 接続が効果を増幅	文脈が多すぎると成功率が下がり費用が増える	最小限に絞り、追加は評価で採否を決める
暗黙知をインタビューで形式知にする	AWS AI-DLC: AI が質問し人が判断する進め方	委任型の利用では理解度が下がり、次のエキスパートが育たない	インタビューにジュニアを同席させ育成を兼ねる
評価基準に組み込む	DORA: 小さなバッチと安全網が効果を増幅	評価だけでは大型化した PR がレビューで詰まる	PR サイズ上限とレビュー観点を同時に入れる

仮説に無かった 4 つの論点を、アクション A1 ・ A5 ・ A6 に組み込む

費用：従量課金

- 2026 年 6 月から補完以外が AI クレジットを消費
- code review は Actions 分も消費
- 対応：A5 予算上限、A6 PR あたり消費

セキュリティ：情報流出

- 非公開データ・外部入力・送信手段がそろそろと漏えい
- MCP でつなぐほど攻撃面が広がる
- 対応：A5 ツール権限を分離

計測：体感と実測の乖離

- 体感で速いと感じても実測は遅いことがある
- アンケートでは展開を判断しない
- 対応：A6 ベースラインと実測

エージェントの多様化


- Agent HQ で他社エージェントも GitHub 上で動く
- Copilot 専用形式に閉じない
- 対応：A1 AGENTS.md ・ skills で作る

03 打ち手

コンテキストはリポジトリに置き、Copilot の各機能と他社エージェントが同じ前提を読む


入れるもの（評価を通ったものだけ）

使う側

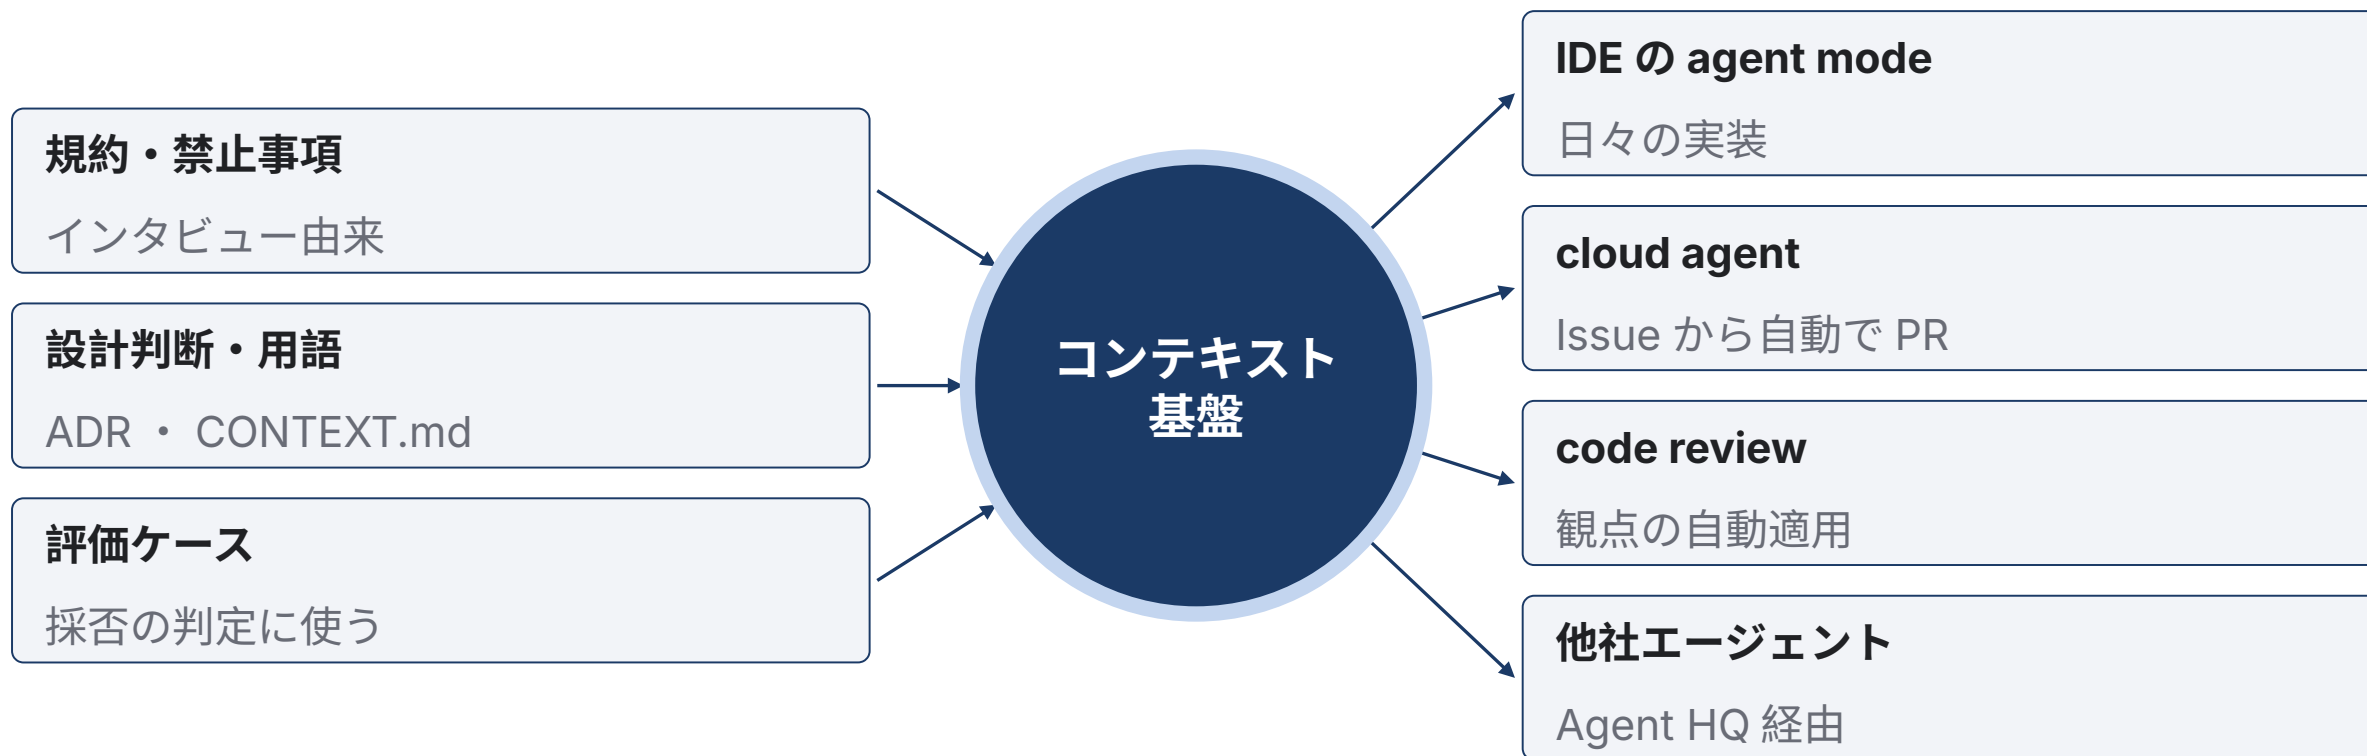

置き場所は .github/ 配下と AGENTS.md。特定ツールの形式に閉じない（A1）

暗黙知はインタビュー skill で引き出し、評価で効果が確認できた分だけ基盤に入れる

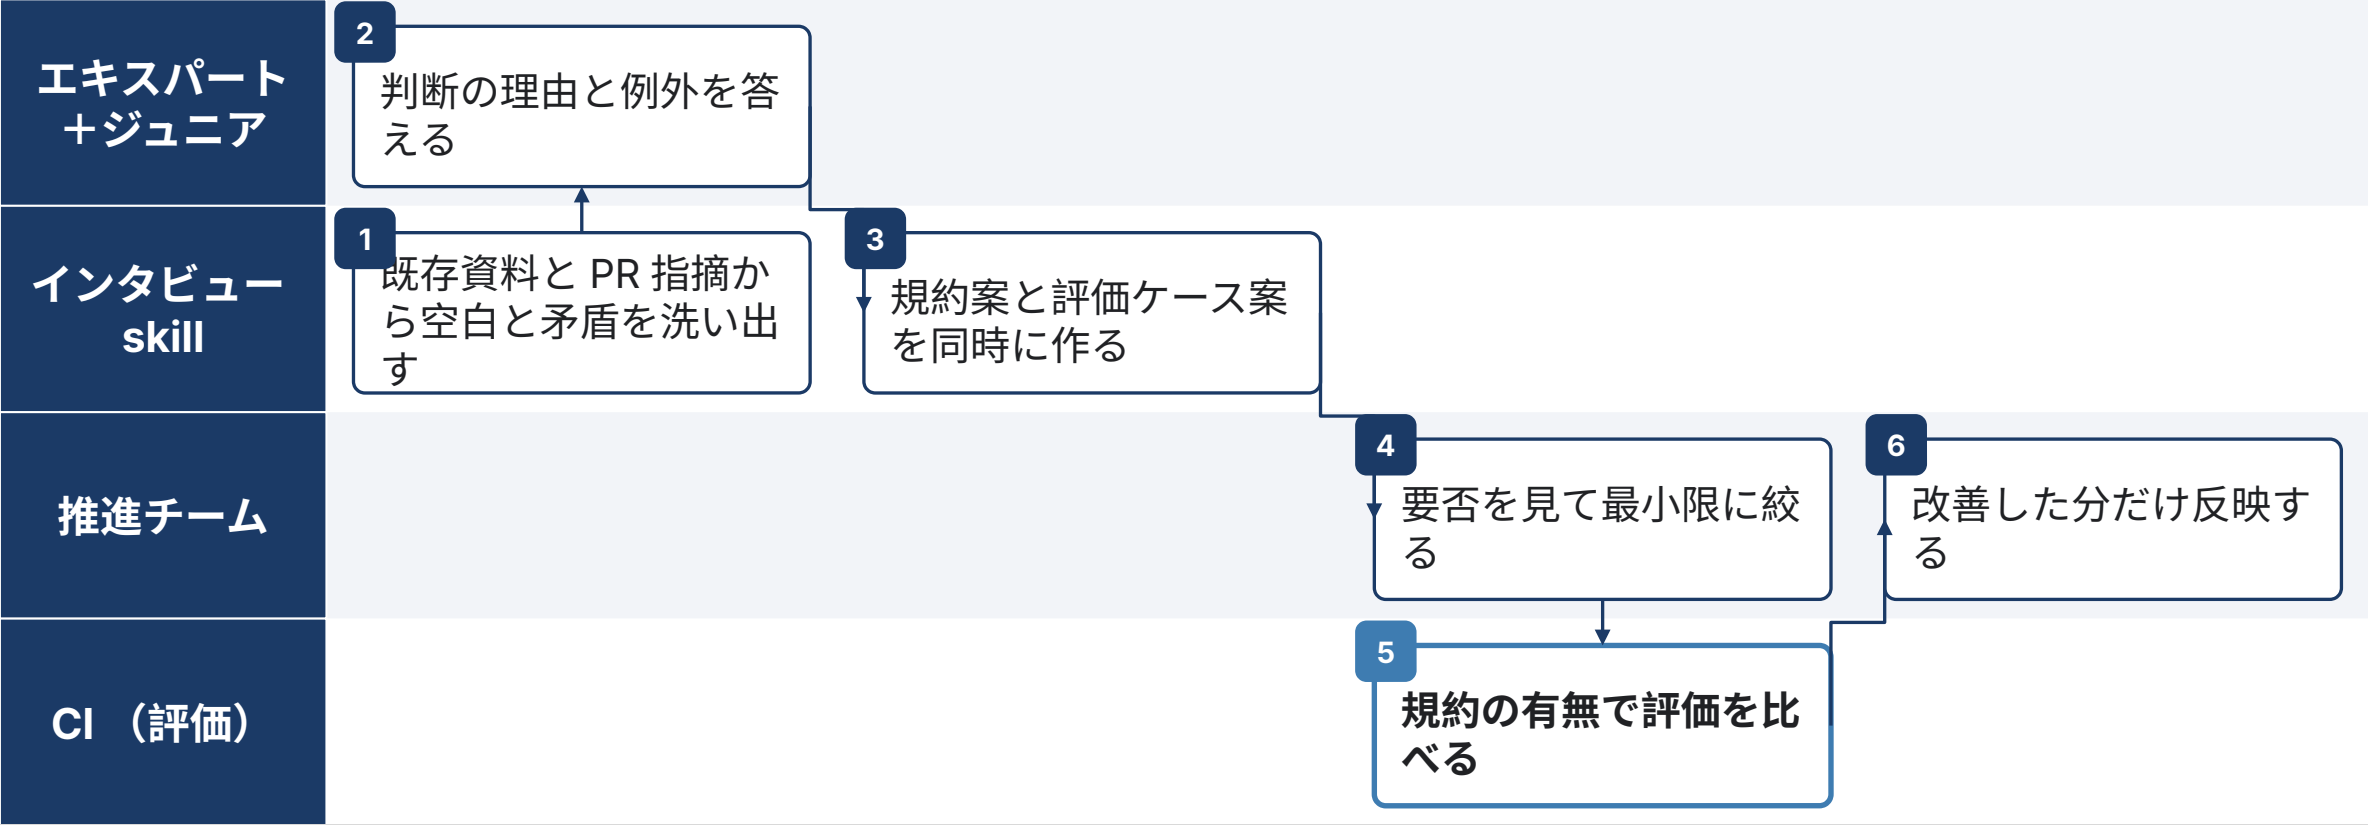

ジュニアは質問役で同席し、判断の理由を自分で説明できるところまでを育成目標にする（A2）

常に読み込むのは最小限にし、手順や背景は必要なときだけ呼び出す場所に分ける

知識の種類	置き場所	読み込まれ方	評価の方法
全体の禁止事項・必須手順	copilot-instructions.md	常に読み込む（最小限）	違反例を含む評価ケース
領域別の規約	.github/instructions/*.instructions.md	対象パスの作業時だけ	該当パスの評価ケース
調査・判断の手順	.github/skills/<name>/SKILL.md	必要なときに呼び出す	手順の再現テスト
設計判断・用語	ADR・CONTEXT.md	skill から参照する	用語と境界の誤用チェック

パイロットは、効果を測れて失敗の影響が小さい管理画面と通知基盤から始める

		推奨 管理画面	推奨 通知基盤	
請求基盤				認証基盤
変更頻度が高い	○	◎	◎	△
エキスパートが在籍	◎	◎	○	◎
自動テストが厚い	△	○	◎	○
失敗時の顧客影響が小さい	×	○	◎	×
リーダーの意欲	○	◎	○	△
合計（◎3・○2・△1・×0）	8	13	13	7

◎ 非常に適合 ○ 適合 △ 一部適合 × 不適合

04 実行計画と判断事項

6つのアクションに担当と完了条件を付け、90日で完了させる

課題		アクション	担当	期限	完了条件
最小限の指示が無い	➡	A1 最小コンテキスト基盤を配置	推進チーム	Day30	2 リポジトリに配置し、 記述ごとに評価ケースがある
暗黙知がエキスパート依存	➡	A2 インタビューで抽出 (ジュニア同席)	推進+エキスパート	Day60	抽出した 40 件を レビュー済み
評価の基準が人依存	➡	A3 評価セットを CI に組み込む	QA	Day60	合格率を週次で 計測している
PR が大きく レビューが詰まる	➡	A4 PR サイズ上限と レビュー観点の統合	テックリード	Day42	上限超え PR の比率を 計測している
利用範囲・権限・ 費用が未統制	➡	A5 利用ガイド・権限分離・ 予算上限	セキュリティ	Day30	ガイド公開と 予算上限の設定
効果を実測していない	➡	A6 実測ダッシュボードと基準値	推進チーム	Day14	4 指標の基準値を取得済み

最初の 30 日で計測・ガイド・基盤を固め、後半は抽出と評価を回す



Day90 の展開判断は、速度だけでなく安定性と費用を同時に実測して行う

-20 %

PR リードタイム

ベースライン比

+0 pt

変更失敗率の増分

上限。速度と引き換えにしない

+0 %

レビュー待ちの増分

上限。下流の詰まりを見る

100 %

AI クレジット予算

上限。マージ PR あたりで管理

目標値はすべて想定。4 指標のうち 1 つでも未達なら、全社展開ではなく範囲を絞って延長する

本日は 4 点をご判断いただき、来週から A6 のベースライン取得に着手する

項目	担当	期限
☐ パイロット 2 チーム（管理画面・通知基盤）の指名	CTO	本日
☐ 推進チーム専任 2 名の 90 日間のアサイン	開発部長	本日
☐ エキスパート 6 名の週 2 時間（ジュニア同席）の確保	開発部長	10/14
☐ AI クレジット予算上限と Day90 判定の 4 指標への合意	CTO	本日

判断が揃えば翌週に A6 ・ A5 へ着手し、Day30 で最初の判定を行う
